

GEOREAL



GEOVAP

ICZ



# DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY


Setkání informatiků  
KÚ PLZEŇSKÉHO KRAJE



ICZ, T-MAPY, GEOREAL, GEOVAP

3. 11. 2022

# ČASOVÁ OSA DTM KRAJŮ

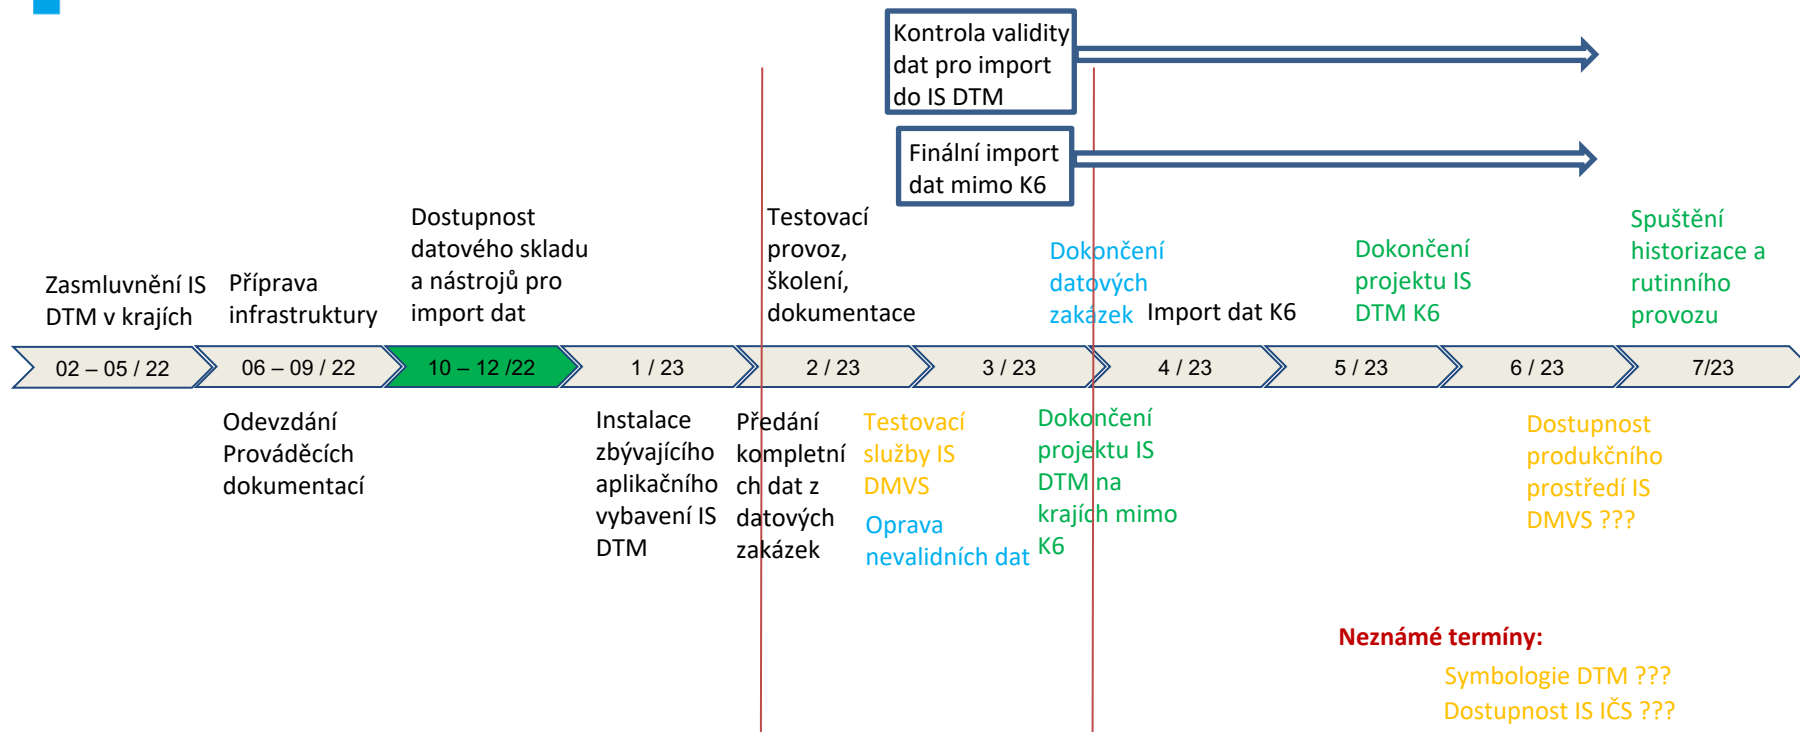

# Termíny dle smlouvy

Kraj	Dokončení IS DTM	Dokončení datových zakázek	IS DMVS
Karlovarský kraj	31. 3. 2023	12 2022	30. 6. 2023
Zlínský kraj	31. 3. 2023	03 2023	30. 6. 2023
K6 (VYS, PAK, ULK, MSK, HKK, JHC)	31. 5. 2023	JHC 03 2023 PAK 03 2023 ULK 03 2023 MSK 03 2023 HKK 03 2023 VYS 05 2023	30. 6. 2023
Liberecký kraj	31. 3. 2023 / 30. 6. 2023	03 2023/06 2023	30. 6. 2023
Jihomoravský kraj	31. 3. 2023	03 2023	30. 6. 2023

# Vybraná rizika projektu IS DTM krajů

## ▶ Vlastní projekty krajů

- Stejný termín dokončení všech částí projektu DTM krajů (SW a Data, zčásti i HW)
- Časový nesoulad importu dat do IS DTM s dodávkou dat z datových zakázek a případných následných oprav
- Časová náročnost importů dat, která neodpovídají limitům v Segmentaci dat ZPS
- Souběh importů dat a průběžného provádění update komponent na kontrolu dat

## ▶ IS DMVS

- Dostupnost testovacích služeb IS DMVS k 28. 2. 2023
- Nefunkčnost produkčního rozhraní IS DMVS při spuštění IS DTM
- Neznámý harmonogram IS DMVS v návaznosti na pozměňovací návrh k zákonu č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb.

## ▶ Další

- Standardizace vizualizace objektů DTM

# Vybraná rizika datových projektů

- ▶ **Inkrementalismus (postupné změny) v oblasti technických podmínek**
  - Jednotný výměnný formát
  - Předpis pro tvorbu dat
  - Pravidla pro topologické kontroly
  - Pravidla pro tvorbu dopravní infrastruktury
- ▶ **Finální import do IS DTM**
  - Segmentace
  - Časová náročnost (iterací) finálního importu do IS DTM
- ▶ **Problémy na straně TDI**

# Shrnutí

## Stav

- ▶ "I když všichni dodrží termíny, tak už teď to nehraje"

## Návrh řešení

- ▶ Realistická úprava vybraných termínů
- ▶ Pragmatická minimalizace vybraných rizik



# Děkujeme za pozornost

