


# Minulost, přítomnost a budoucnost IS DTM K6



z pohledu jednoho

# Minulost - návaznost



## Společné řešení IS DTM více krajů

(SW a HW část)



# Minulost

## Co dál?

- Představení konceptu ostatním krajům – 10. 6. 2020
- Poslední úpravy předaných dokumentů před sdílením do 30. 6. 2020
- Sdílení dokumentů – 1. 7. 2020
- Zapojení dalších krajů – rozhodnutí RK - do 31. 7. 2020
- Schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů (SoCZ) - rozhodnutí ZK - do 30. 9. 2020
- Vyhlášení veřejné zakázky – říjen 2020

# Minulost

## Co dál?

- Představení konceptu ostatním krajům – 10. 6. 2020
- Poslední úpravy předaných dokumentů před sdílením do 30. 6. 2020
- Sdílení dokumentů – 1. 7. 2020
- Zapojení dalších krajů – rozhodnutí RK - do 31. 7. 2020
- Schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů (SoCZ) - rozhodnutí ZK - do 30. 9. 2020
- Vyhlášení veřejné zakázky – říjen 2020

# Minulost – první spolupráce

  
**Kraj Vysočina**



*Ústecký kraj*



  
**PLZEŇSKÝ KRAJ**

# Minulost – první spolupráce



Kraj **Vysočina**



*Ústecký kraj*



Pardubický  
kraj



PLZEŇSKÝ KRAJ

# Minulost - výchozí požadavky společné DTM

- HW řešení bude jedno společné
- SW řešení bude v jedné multitenantní instanci
- SW řešení bude v základu pro všechny kraje stejné (společné moduly)
- SW řešení umožní napojení jiných systémů přes API rozhraní
- SW řešení bude rozšiřitelné, ale rozšíření bude placené už jednotlivými kraji zvlášť
- Postup bude realizován společnou zakázkou navrženou třemi kraji s možností přistoupení dalších krajů

# Minulost - výchozí podklady společné DTM

- Konkrétní návrhy dokumentů:

- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o technické podpoře
- Technické dokumentace
- Smlouvy o centrálním zadávání
- Dohoda o spolupráci při realizaci a provozu DTM

+ podkladové analytické dokumenty vzniklé při přípravě K3 IS DTM dokumentů



# Minulost – nováčci



# Minulost - nový faktor

- Koordinační rada správců DMVS a DTM
  - 16 členů (14 kraje, 2 ČÚZK) + stálí hosté
- + Velká očekávání na začátku
- + Obohacení dokumentace o konkrétní procesy
- Zpomalení celého harmonogramu projektu
- Nedořešené nejen detaily
- Potvrzení společného nepostupu, „vystřízlivění“




# Minulost - Koordinační rada správců DMVS a DTM

- Přepracovaná K3 Technická dokumentace na dokument Společné minimální požadavky na funkčnosti IS DTM každého kraje
  - Minimalizace společných požadavků za všechny kraje dohromady
  - Odstranění ostatních „neminimálních“ prvků
  - Doplněna schémata procesů a jednotlivé vazby vůči IS DMVS
  
- Otázka co s tím?

# Minulost - Zpátky k technickým požadavkům

- Jak využít obdržení materiál od Koordinační rady?
- Přepsat? Rozpustit v ostatním textu? Navázat!

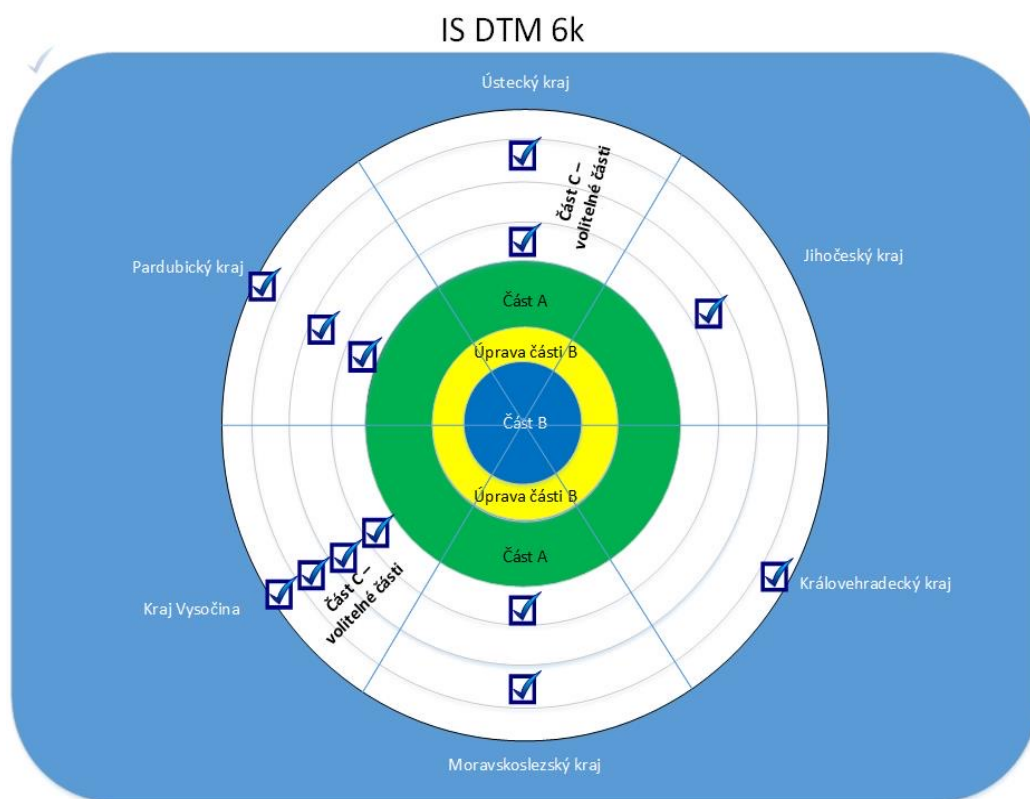

# Minulost - Navázání

- Z K3 období popis a požadavky na IS jako multitenantního celku, obecné věci, vše povinné = **vznik části A**
- Společné minimální požadavky na funkčnosti IS DTM každého kraje = **vznik části B**
- Volitelné části IS pro výběr každého kraje zvlášť = **část C**
  
- Hotovo?

# Minulost - Přeci jenom zásah do neměnného

- První kontakt dokumentace s realitou, první otázky už poučenějších:
  - Jak bude konkrétně pracovat editor?
  - Jaký z toho bude mít konkrétní užitek občan?
  - A jaký obce, kraj, zřizované organizace?
- Bez odpovědí v textu A i B i C, ale nejbliž text B
- Stále příliš rizika pro rozpuštění, ale navázání (rozšíření Funkce XY z části B, kapitola Z) bylo nesrozumitelné už i pro autory.
- Přeci jenom část B rozpustit a ne navázat?
  
- **Úprava části B pro lepší srozumitelnost**

# Minulost - Struktura technické dokumentace

IS DTM 6k



# Minulost - Celý IS nenapíšem

- Změna pohledu na IS DTM
  - Na trhu první ukázky aplikací s různou mírou funkčnosti a uživatelského komfortu. Dosti rozdílná kvalita.
  - První otázky okolí, nové náměty
- Vyřešit nejdůležitější funkce a sady funkcionalit (tzv. komponenty) z různých pohledů nejen editora DTM
- Dát šanci dodavatelům na ucelení zbytku.
- Vyřešit integrace na známé okolní systémy
- Spolehnout se na kvalitní API pro možnost dalšího rozšiřování na zatím neznámé prostředí



# Minulost - PTP

- Druhý v pořadí
- Zahájen 27.9.2021
  - Postoupeny dokumenty Technická dokumentace v57, Návrh smlouvy o technickou podporu v17, Předpokládaný harmonogram a průvodní dopis
- Ukončen 18.10.2021 pro jednom vyžádaném prodloužení
  - 4 reakce, 3 společnosti, připomínky se netýkaly SoTP
- Reakce K6 v protokole (veřejný, dtmkraju.cz)
- Velká nesrozumitelnost v základní rovině
- Změny v TD v rozšíření textů, obrázků pro lepší pochopení a transparentnost
- V protokolu zavedena kolonka vysvětlení zadavatele

# Přítomnost IS DTM K6

- Finalizace technické dokumentace zapracováním akceptovaných připomínek, SoTP beze změny
- Ladění podmínek ESCROW
- ÚK finalizace ostatních dokumentů včetně výzvy VZ



Ústecký kraj



Pardubický kraj



Jihočeský kraj



Kraj Vysočina

KRÁLOVÉHRADECKÝ  
KRAJ



Moravskoslezský kraj

# Přítomnost IS DTM K6 – pozadí

7 krajů

41 lidí

Desítky videokonferencí, konzultací a kompromisů

Stovky hodin komunikace a tvorby dokumentů

Nervozita

Nervozita



Ústecký kraj



Pardubický kraj



Jihočeský kraj



Kraj Vysočina

KRÁLOVÉHRADECKÝ  
KRAJ




Moravskoslezský kraj

# Budoucnost

- Co nejdříve VZ, výběr zhotovitele a realizace
- Už nikdy opakování něčeho podobného.

# Závěr

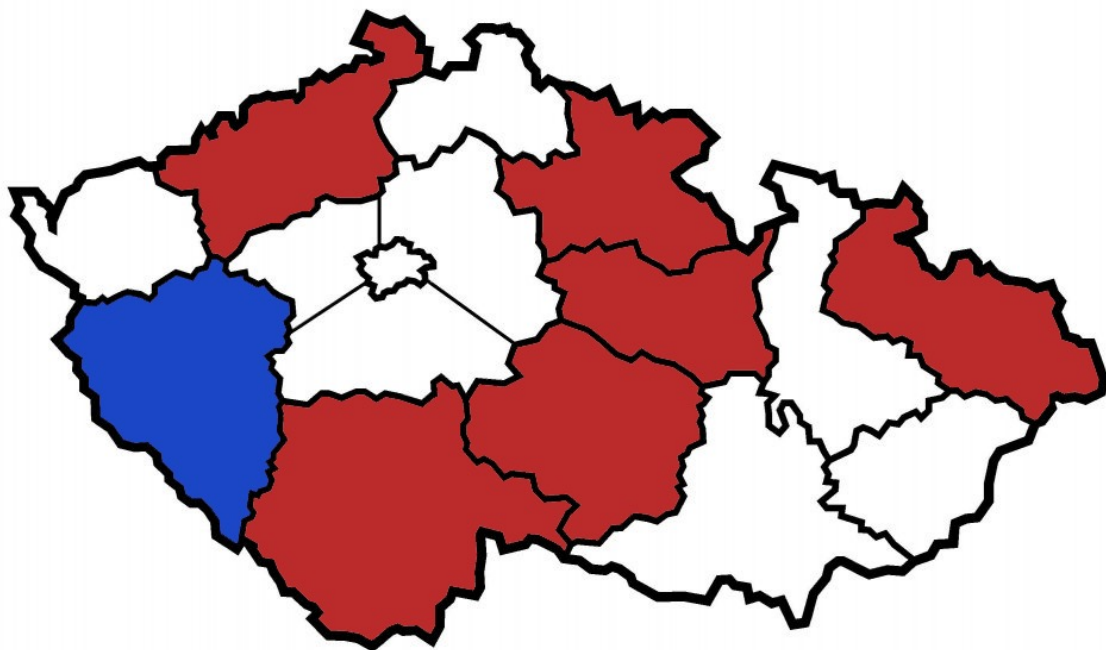

Děkuji všem, co se na tvorbě DTM, ať už K6  
nebo jinde podílí.

Divákům děkuji pro změnu za pozornost, přeji pěkný den.

David Rezler  
david.rezler@pardubickykraj.cz
